



SINTESI DELLE ATTIVITA'

Progetto Life/IDEMS

**PROJECT MANAGEMENT
COMUNE DI RAVENNA**

2^a VISITA DI MONITORAGGIO

2 febbraio 2007



Project realized with the contribution of the European Commission

LIFE - IDEMS

Acronimo

IDEMS

Nome del Progetto

Integration and Development of Environmental Management Systems

Beneficiario

Comune di Ravenna (D)

Partner

Comuni di Ferrara (D), Mantova (D), Amaroussion (D), Vaxjio (R), Haidelberg (R), Dresden (R) e Coordinamento LA21

Durata

32 mesi (Ottobre 2005 – Maggio 2008)

Budget complessivo

815.000 €


Co-finanziamento UE

407.500 € (50 %)


Legenda

(D) = Developer Cities

(R) = Reference Cities



Le fasi e i Tempi del progetto approvato dalla CE

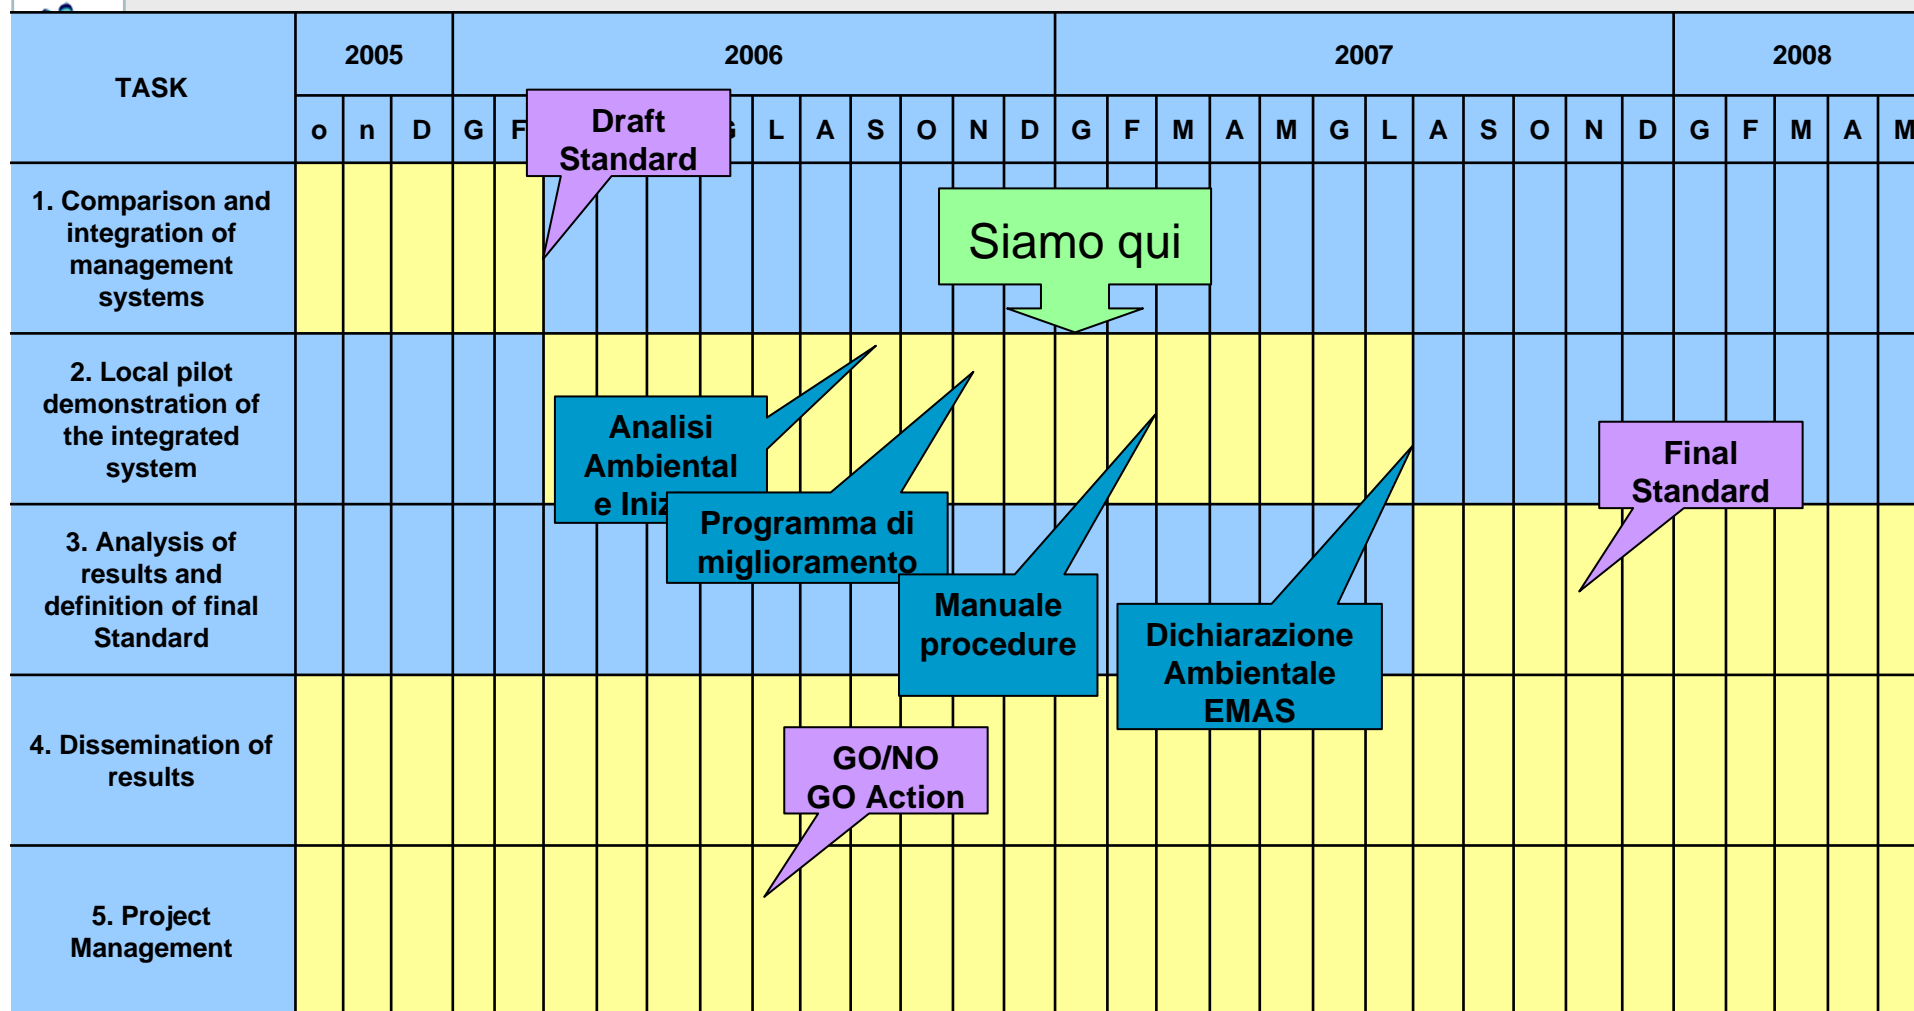

Stato di avanzamento del Progetto 1/3

Gli incontri fino ad ora effettuati:


- 27 ottobre 2005 start up del progetto presso la fiera Ecomondo di Rimini
- 24 novembre 2005 incontro a Ravenna per analizzare lo stato dell'arte di ciascuna città developer (Report of comparison)
- 11 gennaio 2006 incontro a Bologna per la definizione del quadro generale e delle differenze tra le diverse città (Internal audit)
- 9/10 febbraio 2006 meeting internazionale a Ravenna, ristretto ai partner reference e developer per la giornata del 9 in cui è stato presentato il Report of comparison e il draft standard, e internazionale per la giornata del 10 dal titolo "Emas e i bilanci ambientali"
- 23 marzo 2006 incontro a Ravenna in cui viene presentato il Training Kit e discusso il Draft standard
- 4 maggio 2006 incontro a Ferrara per la discussione dei point 7 e 8
- 8 maggio 2006 incontro Directorial Board per illustrazione fasi della task 2
- 12 giugno 2006 incontro a Ravenna per presentazione go-no go action e piano della divulgazione
- 25/26 settembre 2006 incontro tra partner reference e developer a Mantova per presentazione point 1 e 10
- 8 novembre 2006 incontro a Rimini presso la fiera Eco mondo per la presentazione dei point 1 e 3
- 18 gennaio 2007 Directorial Board a Bologna per condivisione report intermedio
- 1 / 2 febbraio 2007 incontro tra partner developer e refernce per presentazione point 4, 5 e 9 e visita di monitoraggio di Timesis

Stato di avanzamento del Progetto 2/3

- dopo una prima fase (TASK 1) di analisi dei tre strumenti (EMAS, ECOBUDGET e CLEAR)
- e una prima definizione del Draft Standard quale modello integrato elaborato in forma di bozza
- si trova ora nella fase di **sperimentazione** da parte delle quattro città developer (Ravenna, Ferrara, Mantova, Amaroussion)

Al termine di questa seconda fase (TASK 2)

- gli enti dovranno **giungere alla Dichiarazione EMAS** e avviarsi verso l'iter di Registrazione



Stato di avanzamento del Progetto 3/3

Il modello del **draft standard** proposto è costituito dagli **ELEVEN POINTS**:(che qui elenchiamo)

- I. **Policies making e collegamenti con la pianificazione strategica**
- II. **Criteri organizzativi e struttura**
- III. **Filiera e sostenibilità**
- IV. **Qualità dei dati, tracciabilità e loro controllo operativo sulla filiera**
- V. **Assessment**
- VI. **Partecipazione (stakeholder engagement)**
- VII. **Analisi ambientale iniziale**
- VIII. **Conformità legislativa**
- IX. **Conti monetari**
- X. **Miglioramento continuo**
- XI. **Comunicazione informazione**

Output tecnici di progetto

Gli outputs fino ad ora (dicembre 2006) prodotti del progetto IDEMS sono:

- TASK 1


- Report of the internal audit by each Developer city
- Report of Comparison of the various systems adopted (disponibile tra i documenti consultabili)
- Draft standard to be developed in the pilot demonstrations (sarà presto disponibile una versione per la divulgazione)
- Customised working plans for local pilot demonstrations
- Training Kit

-TASK 2

- Document which synthesizes current situation (go / no go report)
- Strategic document which synthesizes intervention to be enacted (in fase di redazione mid-term report)

TASK 4 – ATTIVITA' DI DISSEMINATION

- E' stato redatto un Piano della Divulgazione e Comunicazione
- Il piano è stato approvato dalla Commissione Europea che ha però sottolineato la carenza di una programmazione a tappe per la disseminazione durante lo sviluppo del progetto
- Al fine di adempiere alla dissemination durante lo sviluppo del progetto ogni partner sta impiegando le risorse finanziarie messe a disposizione, compilando puntualmente una tabella in cui queste vengono registrate
- Queste registrazioni opportunamente allegate al piano di disseminazione forniranno un quadro aggiornato in tempo reale delle attività svolte



Attività di disseminazione del progetto IDEMS 1/3

- realizzazione logo Life IDEMS
- progettazione e realizzazione del sito IDEMS
- pubblicità e diffusione del progetto tramite: sito di Agenda 21 del Comune di Ravenna, sito del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e sua rete di network, presentazione del progetto al Gruppo di Lavoro della “Campagna facciamo i conti con l’Ambiente” del network Clear, collegamento al sito da pagine web dei partner
- conferenze stampa e comunicati stampa: articoli su stampa locale e regionale, conferenza stampa a Ravenna per presentazione del progetto (rivista “Regioni e Ambiente”)
- redazione e diffusione del format del progetto per fornire ai cittadini interessati una informazione ampia e corretta sulle finalità del progetto, e richiesta ai partner per la sua diffusione
- convegno internazionale dal titolo “Emas e i bilanci Ambientali” 10 febbraio 2006: in cui è stato presentato il progetto Life IDEMS
- banner inviato ai partner da inserire nel loro sito
- presentazione ufficiale del progetto IDEMS a ECOMONDO al convegno sul tema “La certificazione ambientale di processo e di prodotto”
- pubblicazione di nota tecnico-scientifica relativa ai primi risultati del progetto IDEMS nel volume 1 de I quaderni di ECOMONDO
- Presentazione ufficiale del progetto IDEMS a SIVIGLIA
- Riferimenti a IDEMS nel libro redatto da Vaccari e Bratti “Gestire i beni comuni” ed edito da Edizioni Ambiente
- Presentazione progetto Life IDEMS a Palermo durante l’incontro di ENVIPLANS
- Il progetto IDEMS viene citato a riferimento all’interno della leggere regionale Emilia Romagna di sostegno e per la diffusione della contabilità ambientale e dei bilanci ambientali per gli Enti locali.

Attività di disseminazione del progetto IDEMS 2/3

FERRARA:

Introduzione del banner sulla home page del sito

Introduzione del progetto ai membri del Forum in occasione del Forum plenario
Agenda21

Il progetto Idems è oggetto di comunicazione interna per quanto riguarda il personale coinvolto dal Sistema di Gestione Ambientale

AMAROUSSION:

Informative note on the conduct of the international conference EMAS and the Environmental Budget and on the IDEMS project sent to the attention of the Greek Ministry of Environment

Press Release: 'Odos Themidos' - monthly local magazine

Press Release: 'Nea Gnomi' – local newspaper

Press Release: 'EPIKERA, VORION PROASTION'– local newspaper

Press Release: 'TYPOS PROASTION'– local newspaper

Press Release: 'AMARYSIA'– local newspaper

The city of Amaroussion was given the opportunity to present in detail the LIFE projects that it has undertaken over the years, amongst which is the IDEMS at the LIFE International Conference- The Quest for Sustainability, Coimbra-Portugal

VAXJO:

Uploading information about the project at the homepage of Vaxjö Municipality
(www.vaxjo.se)

Attività di disseminazione del progetto IDEMS 3/3

COORDINAMENTO AGENDE21

- Articolo di presentazione del progetto Life IDEMS sul numero di marzo 2006 della rivista Regioni&Ambiente (oltre 12.000 indirizzi)
- Inserimento del banner del progetto Life IDEMS nella home del sito del Coordinamento e link al sito del progetto (numero medio mensile di visitatori sito: 36.600, anno 2006)
- Presentazione progetto su bilancio sociale 2005 (1000 copie)
- Illustrazione del progetto IDEMS nell'ambito della presentazione delle attività del Coordinamento in occasione del convegno nazionale organizzato a Trieste da WWF-Italia sul tema "Biodiversità e partecipazione" (70 partecipanti)
- Articolo breve sulla newsletter nr. 25 del Coordinamento (spedita a un indirizzario di 4.000 enti e agenzie)
- Presentazione progetto a delegazione straniera del progetto LOCUS (Siria) (20 partecipanti)
- Presentazione Progetto a Palermo in occasione di una lezione su 'Agenda 21 Locali e Sviluppo Sostenibile' a cura del Dott.Nora
- Presentazione progetto a Palermo in occasione del Convegno South EU Urban ENVIPLANS (200 partecipanti)
- Illustrazione del progetto IDEMS nell'ambito della presentazione delle attività del Coordinamento in occasione del convegno organizzato da ARPA ER "La politica integrata di prodotto: gli strumenti e le sinergie per la tutela ambientale" - Rastignano (BO) (200 partecipanti)

FASI DI PROJECT MANAGEMENT GIA' DEFINITE E CONCLUDE (TASK 5)

- Costituzione del Directorial Borad e Technical Board
- Definizione delle fasi del progetto
- Approvazione e firma Great Agreement
- Definizione e approvazione Linee Guida per la rendicontazione
- Sottoscrizione contratti con assistenza esterna in base alle indicazioni contenute nel progetto relativamente ai contenuti tecno-scientifici (ancora in sospenso la firma del contratto da parte di ICLEI per una problematica relativa all'IVA ora risolta . E' stato inviato il contratto corretto siamo in attesa che ritorni e quindi daremo le indicazioni agli altri partner)
- I^ visita di monitoraggio da parte della C.E. conclusa con successo. Viene confermata dalla buona impressione ricevuta anche dal I^ progress report.
- Invio del primo Progress Report
- Approvazione da parte della C.E. del Piano della Comunicazione e Diffusione
- Incontro per valutare lo stato del progetto e condividere le azioni che devono essere previste per un buon proseguimento dello stesso (Mantova 2006)
- Approvazione del documento di Go/No Go Action da parte della C.E.

ESITI DEL DIRECTORIAL BOARD DEL 18/01/07

- Il Directorial Board (ristretto ai soli partner developer italiani) ha stabilito con decisione unanimità la richiesta di proroga di 10 mesi del progetto IDEMS, in modo tale da avere una proroga nella durata della task 2 e presentare la Dichiarazione Ambientale per febbraio 2008
- La richiesta è stata condiviso valutato che :
 - - Un processo EMAS per un ente locale prevede in linea di massima una tempistica più lunga di quella prevista nel nostro cronoprogramma
 - - La data prevista da Gantt chart approvato del progetto IDEMS per la realizzazione dei documenti necessari per il raggiungimento della registrazione EMAS (task 2) che ha avuto inizio il 1/03/2006, fissava la presentazione della Dichiarazione Ambientale per il 31/07/2007
 - - Il raggiungimento della Registrazione è indicato quale requisito indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi progettuali
 - - I partner hanno condiviso la difficoltà di garantire l'output relativo alla presentazione della Dichiarazione Ambientale al 31 /07/2007 con conseguente dilatazione dei tempi successivi
- Da successivi contatti con la società TIMESIS ci è stato suggerito di posporre la richiesta di variazione sostanziale dell'accordo sottoscritto con la CE chiedendo una proroga in quanto altri progetti hanno riscontrato una problematica simile e si resta quindi in attesa di una valutazione in merito

PROSSIME SCADENZE DEL PROJECT MANAGEMENT:

1. La **redazione** del MID - TERM REPORT (entro fine febbraio)
 - ❑ *Analisi dello stato di avanzamento del progetto*
 - ❑ *Report di rendicontazione amministrativa intermedia*
 - ❑ *Richiesta versamento da parte della Comunità Europea della seconda tranche di finanziamento*
 - ❑ *Esposizione approfondita dei motivi di richiesta di prolungamento (?) del progetto IDEMS, per la maggior parte correlati alle problematiche relative al conseguimento della registrazione EMAS*


2. Richiesta invio
 - ❑ **rendicontazione** (aggiornata al 28/02)
 - ❑ aggiornamento **attività di dissemination** effettuate da parte dei partner a fine febbraio

3. Definizione data 5° training event a Ravenna (giugno - luglio 2007) con partecipazione partner developer e reference

4. Comunicazione incontro con partner developer data prox monitoraggio che si svolgerà a novembre 2007 (l'incontro durerà una giornata e sarà ristretto ai soli partner developer)

Difficoltà riscontrate dal Project Management

- Definizione, condivisione e approvazione Accordo di Partenariato
- Un budget sottodimensionato rispetto alla portata del progetto
- La Comunità Europea in occasione del I^o Progress Report e della I^a visita di monitoraggio ci ha segnalato la necessità di prevedere nel sito anche una parte in lingua greca. Ma purtroppo le lettere greche non vengono riconosciute dal programma e tale operazione non è riuscita. Tale criticità verrà segnalata nel middle report.
- Tempistiche di progetto da rivalutare in base alle scadenze previste soprattutto per quanto riguarda la fase interna ai singoli partner di ottenimento della registrazione EMAS

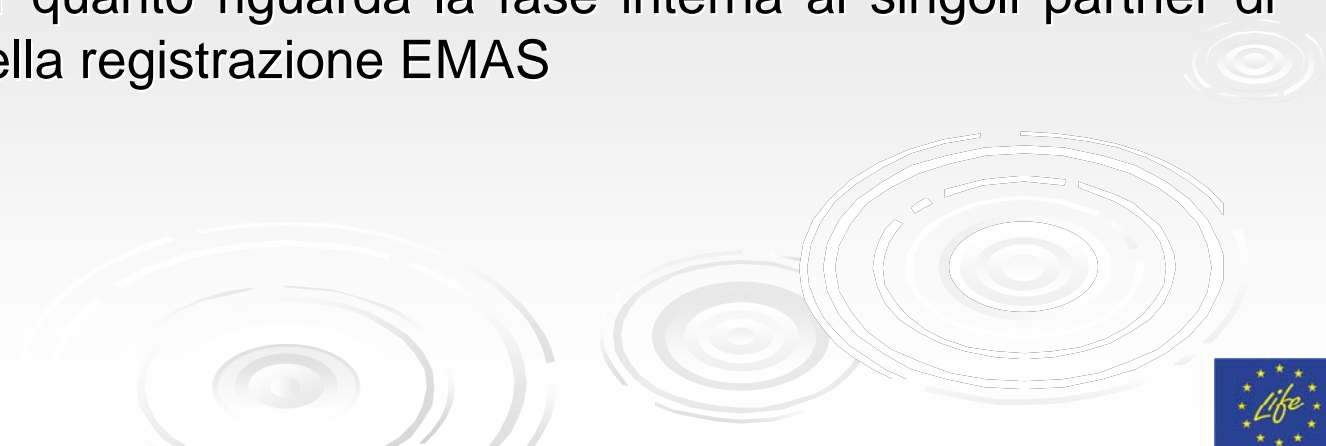

NOTIZIE DALLA COMUNITA' EUROPEA

- *Per la III visita di monitoraggio, prevista in novembre 2007, la Commissione Europea ha dichiarato di essere presente (atteggiamento riservato a quei progetti che possono consentire apporti utili alle variazioni legislative comunitarie). Saranno presenti il responsabile tecnico della C.E. Walter Cortellini e il Responsabile finanziario (di cui verrà in seguito comunicato il nominativo). Si tratta di una visita di monitoraggio normale ma condotta personalmente dalla Commissione e prevederà anche maggiori controlli relativi alla parte finanziaria .*
- *Ci è stato comunicato un cambiamento dei referenti del progetto nella Commissione Europea:*
 - *referente tecnico: Walter Cortellini*
 - *referente amministrativo: in fase di definizione*

